




E/V 피트 내부로 추락



재해개요

2024. 05. 00.(일) 14:30경 경남 김해 소재
0000 신축공사 현장에서 재해자가 이동중
피난층 엘리베이터 피트 내 운반구로 떨어져
사망한 재해임.

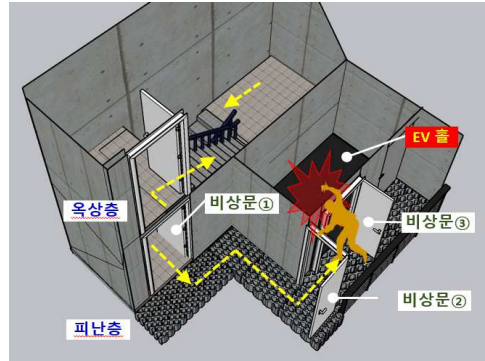

발생원인

- ▶ 사고현장의 위험요인
- 엘리베이터 홀 개구부로 통하는 비상문이 시건되지 않고 출입이 가능한 상태로 관리되었음.
- 추락위험 표지가 설치되지 않아, 근로자가 추락 위험을 인지하지 못함.

예방대책

- ① 비상문 시건 철저
 - 비상문의 시건을 통하여 관계자 외 출입을 제한하고, 폐문 시 자동잠금 기능 손잡이를 설치하는 등 추락위험 장소 출입을 통제하여야 함.
- ② 추락위험 표지 설치
 - 추락위험이 높은 장소임을 근로자가 인지할 수 있도록 표지를 설치하여야 함.
- ③ 위험구역 출입관리 철저
 - 사고위험구역에 출입할 경우 출입문 키 분출대장 및 출입관리대장을 작성하여 위험장소 출입에 대한 관리감독을 철저히 하여야 함.

※ 본 PPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다
